



# Město Lovosice


<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>				ZH č.: 6	
<b>Identifikace:</b>					
<b>REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH</b> <b>Přizdívky instalačních jader</b>					
<b>CUSTOMER /OBJEDNATEL:</b> Město Lovosice Školní 407/2 410 30 Lovosice			<b>CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:</b> GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659 413 01 Roudnice nad Labem		
<b>Změna je vyvolána</b>					
Záměrem Objednatele <input type="checkbox"/>	Záměrem Zhotovitele <input type="checkbox"/>	Veřejnopráv. požadavky <input type="checkbox"/>	Vyšší mocí <input type="checkbox"/>	Jinou okolností <input checked="" type="checkbox"/>	
Datum iniciace změny: 03.05.2022 Referenční korespondence/komunikace/zápis: Zápis ve stavebním deníku					
<b>Změna se týká</b>					
Stavební <input checked="" type="checkbox"/>	Strojní <input type="checkbox"/>	Elektro <input type="checkbox"/>	MaR <input type="checkbox"/>	Ostatní <input type="checkbox"/>	
<b>Provedení změny má vliv na:</b>					
Realizační harmonogram Díla <input type="checkbox"/>	Záruky Zhotovitele či vendorů <input type="checkbox"/>	Cenu díla <input checked="" type="checkbox"/>	Kvalitu díla <input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní smluvní podmínky <input type="checkbox"/>	
<b>Popis změny:</b>					
<p>Přizdívky v koupelnách, kde nebylo možné nové rozvody zasekat do stávajících stěn. Po odkrytí bylo zjištěno, že stávající konstrukce příčky téměř neexistuje, silně narušeno stávajícími rozvody. Stavebně jednodušší bylo provést přizdívky než vybourávat narušené zdivo, podpírat ho a následně ho znovu podezdívat novým zdivem.</p> <p>Jedná se o vícepráce, které nemohly být v době zpracování projektové dokumentace zadavateli známy.</p>					

# Město Lovosice

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>		ZH č. : 6
<b>Popis změny (pokračování):</b> Dotčené výkresy (číslo, revize, název): Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění.		
<b>Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):</b>  Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v Příloze č. 1 2022/23/6 – Změnový list 6	<b>Termín provedení změny:</b> Zahájení: W 13 Ukončení: W 19	
Fakturační a platební podmínky:	Dopady na Realizační harmonogram – identifikace:  <b>Nemá dopad na harmonogram</b>	
<b>Přílohy a poznámky:</b> Příloha 1 <u>Vyjádření AD/projektanta:</u> Souhlasí  <u>Vyjádření TDS:</u> V uvedených místnostech bylo nezbytné přízdívky provést v souladu s popisem změny.		
<b>Ostatní/různé:</b>		
<b>Navrhovatelé:</b>		
<b>Podpis a datum:</b>	<b>Podpis a datum:</b> 22.06.2022 	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	
<b>Schvalovatelé:</b>		
<b>Podpis a datum:</b>	<b>Podpis a datum:</b>	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>	<b>ZH č. : 6</b>
------------------------	------------------

Fotodokumentace:

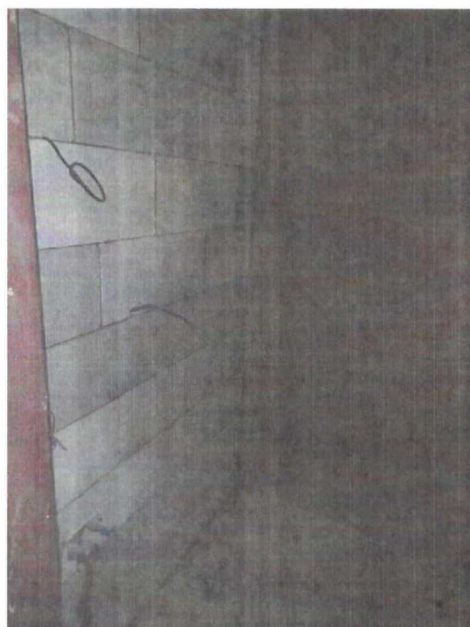




# Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ		ZH č.: 13		
<b>Identifikace:</b> REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH Odstranění emailových soklů na chodbách				
<b>CUSTOMER /OBJEDNATEL:</b> Město Lovosice Školní 407/2 410 30 Lovosice		<b>CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:</b> GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659 413 01 Roudnice nad Labem		
<b>Změna je vyvolána</b>				
Záměrem Objednatele <input type="checkbox"/>	Záměrem Zhotovitele <input type="checkbox"/>	Veřejnopráv. požadavky <input type="checkbox"/>	Vyšší mocí <input type="checkbox"/>	Jinou okolností <input checked="" type="checkbox"/>
Datum iniciace změny: 03.05.2022 Referenční korespondence/komunikace/zápis:				
<b>Změna se týká</b>				
Stavební <input checked="" type="checkbox"/>	Strojní <input type="checkbox"/>	Elektro <input type="checkbox"/>	MaR <input type="checkbox"/>	Ostatní <input type="checkbox"/>
<b>Provedení změny má vliv na:</b>				
Realizační harmonogram Díla <input type="checkbox"/>	Záruky Zhotovitele či vendorů <input type="checkbox"/>	Cenu díla <input checked="" type="checkbox"/>	Kvalitu díla <input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní smluvní podmínky <input type="checkbox"/>
<b>Popis změny:</b>  Vzhledem k zásahům do povrchů a charakteru profilovaných emailových soklů bylo nutné tyto sjednotit a stávající emaily odstranit.  Jedná se o dozdivky, nové vedení instalací jednotlivých inženýrských sítí, kdy nebylo možné původní povrchy zachovat. V tomto případě se jedná pouze o změnu položky v daném fyzickém objemu. Uplatňuje se odpočet dle původní jednotkové ceny.				

# Město Lovosice

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>		ZH č. : 13
<b>Popis změny (pokračování):</b> Dotčené výkresy (číslo, revize, název): Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění. Záznam se stavebním deníku.		
<b>Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):</b>  Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v Příloze č. 1 2022/23/6 – Změnový list 13	<b>Termín provedení změny:</b> Zahájení: W 9 Ukončení: W 32	
Fakturační a platební podmínky:	Dopady na Realizační harmonogram – identifikace:  <b>Nemá dopad na harmonogram</b>	
<b>Přílohy a poznámky:</b> Příloha 1 <u>Zdůvodnění zhotovitele:</u> Výkaz výměr neobsahoval odstranění emailových nátěrů. Vyplynulo během realizace. <u>Vyjádření AD/projektanta:</u> Předpokládala se pouze oprava stavbou zasažených ploch a toto bylo zapracováno do rozpočtu. Investor požadoval sjednocení kvality provedení povrchů. <u>Vyjádření TDS:</u> Domníváme se, že vzhledem k zásahům do omítek na chodbách z důvodů dozdívek, nových vedení instalací jednotlivých inženýrských sítí, nebylo možné původní povrchy zachovat. V tomto případě se jedná pouze o změnu položky v daném fyzickém objemu. Uplatňuje se odpočet dle původní jednotkové ceny. Doporučujeme ZL schválit.		
<b>Ostatní/různé:</b>		
<b>Navrhovatelé:</b>		
<b>Podpis a datum:</b>	<b>Podpis a datum:</b> 22.06.2022 	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	
<b>Schvalovatelé:</b>		
<b>Podpis a datum:</b>	<b>Podpis a datum:</b>	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	




<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>	<b>ZH č. : 13</b>
<b>Fotodokumentace:</b>	
	





# Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ				ZH č.: 14 + 16	
<b>Identifikace:</b> <b>REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH</b> <b>Podchycení a řezání konstrukcí schodišť při bourání</b>					
<b>CUSTOMER /OBJEDNATEL:</b> Město Lovosice Školní 407/2 410 30 Lovosice			<b>CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:</b> GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659 413 01 Roudnice nad Labem		
<b>Změna je vyvolána</b>					
Záměrem Objednatele	Záměrem Zhotovitele	Veřejnopráv. požadavky	Vyšší mocí	Jinou okolností	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Datum iniciace změny: 03.05.2022 Referenční korespondence/komunikace/zápis:					
<b>Změna se týká</b>					
Stavební	Strojní	Elektro	MaR	Ostatní	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Provedení změny má vliv na:</b>					
Realizační harmonogram Díla	Záruky Zhotovitele či vendorů	Cenu díla	Kvalitu díla	Ostatní smluvní podmínky	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Popis změny:</b>					
<p>Vyplývá z projednaného a schváleného technologického postupu bouracích prací po ověření skutečného stavu dotčených konstrukcí. Po odkrytí konstrukcí bylo doloženo, že se jedná o spojenou konstrukci výtahové šachty a schodiště, předpokládalo se, že se jedná o dvě oddělené konstrukce.</p> <p>Původní návrh v projektové dokumentaci nepředpokládal, že by výtah a schodiště nebyly stavebně odděleny. Standartní řešení staveb je oddělní těchto dvou nezávislých částí stavby, na které působí jiné statické a dynamické síly. Sondy se prováděly z důvodu ověření konstrukce. Nebylo možné sondou ověřit, že se jedná o monolitickou konstrukci.</p>					

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>		ZH č. : 14 +16
<b>Popis změny (pokračování):</b> Dotčené výkresy (číslo, revize, název): Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění. Záznam se stavebním deníku.		
<b>Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):</b>  Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v Příloze č. 1 2022/23/6 – Změnový list 14  Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v Příloze č. 1 2022/23/6 – Změnový list 16	<b>Termín provedení změny:</b> Zahájení: W 13 Ukončení: W 16	
Fakturační a platební podmínky:	Dopady na Realizační harmonogram – identifikace: <b>Nemá dopad na harmonogram</b>	
<b>Přílohy a poznámky:</b> Příloha 1 <u>Zdůvodnění zhotovitele:</u> Nutné provedení podchycení schodišťových konstrukcí před bouráním. Po konzultaci technologického postupu se statikem bylo nutné oddělit žb. schodiště řezem od výtahové šachty. Oddělením vznikly dvě nezávislé konstrukce, kde u schodiště v místě řezu bylo podchycení nutné. Původně navržený technologický postup nepředpokládal monolitickou konstrukci. <u>Vyjádření AD/projektanta:</u> Vzhledem k upravení technologického postupu se jedná o oprávněný požadavek. Bez oddělení schodiště a výtahové šachty nelze pokračovat v rekonstrukci. Nutné oddělení. <u>Vyjádření TDS:</u> Položku považujeme za oprávněnou, práce se provedly, bez nich nebylo možné stávající schodiště odstranit. ZL nehraje zásadní roli v celkovém objemu víceprací.		
<b>Ostatní/různé:</b>		
<b>Navrhovatelé:</b>		
Podpis a datum:  CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	Podpis a datum: <i>22.06.2022</i>  CUSTOMER/OBJEDNATEL	

# Město Lovosice

Schvalovatelé:	
Podpis a datum:	Podpis a datum:
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>	<b>ZH č. : 14+16</b>
------------------------	----------------------

Fotodokumentace:





# Město Lovosice

ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ				ZH č.: 15	
<b>Identifikace:</b> REKONSTRUKCE A ZMĚNA DISPOZIC UBYTOVNY V LOVOSICÍCH Změna objemu omítek					
<b>CUSTOMER /OBJEDNATEL:</b> Město Lovosice Školní 407/2 410 30 Lovosice			<b>CONTRACTOR/ ZHOTOVITEL:</b> GKR STAVBY s.r.o. Kratochvílova 2659 413 01 Roudnice nad Labem		
<b>Změna je vyvolána</b>					
Záměrem Objednatele <input type="checkbox"/>	Záměrem Zhotovitele <input type="checkbox"/>	Veřejnopráv. požadavky <input type="checkbox"/>	Vyšší mocí <input type="checkbox"/>	Jinou okolností <input checked="" type="checkbox"/>	
Datum iniciace změny: 03.05.2022 Referenční korespondence/komunikace/zápis:					
<b>Změna se týká</b>					
Stavební <input checked="" type="checkbox"/>	Strojní <input type="checkbox"/>	Elektro <input type="checkbox"/>	MaR <input type="checkbox"/>	Ostatní <input type="checkbox"/>	
<b>Provedení změny má vliv na:</b>					
Realizační harmonogram Díla <input checked="" type="checkbox"/>	Záruky Zhotovitele či vendorů <input checked="" type="checkbox"/>	Cenu díla <input checked="" type="checkbox"/>	Kvalitu díla <input checked="" type="checkbox"/>	Ostatní smluvní podmínky <input type="checkbox"/>	
<b>Popis změny:</b>  Dle projektové dokumentace bylo navrženo a předpokládáno odstranění veškerých nesoudržných omítek a jejich vyspravení vápenocementovou maltou.  Projektová dokumentace byla zhotovena 06/2020, práce byly zahájeny 01/2022. V mezidobí došlo k další degradaci a poškození omítek. Předpokládaný rozsah oprav z původních 30% objemu omítky je vyšší cca až 75% omítek. Z důvodu sjednoceného vzhledu je navržena oprava v rozsahu 100% s novým štukem.					

# Město Lovosice

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>		ZH č. : 15
<b>Popis změny (pokračování):</b> Dotčené výkresy (číslo, revize, název): Nebylo do PD doplněno, touto změnou se PD nemění. Záznam se stavebním deníku.		
<b>Změna dohodnuté ceny Díla (bez DPH):</b>  Cena stanovena dle kalkulace/cenového rozkladu v Příloze č. 1 2022/23/6 – Změnový list 15 Fakturační a platební podmínky:	<b>Termín provedení změny:</b> Zahájení: W 9 Ukončení: W 33 původní, nově W 39	
	Dopady na Realizační harmonogram – identifikace:  <b>Má vliv na HMG: 2.023Nhod., což je 238dní/10 pracovníků = 25 dní</b>	
<b>Přílohy a poznámky:</b> Příloha 1 <u>Zdůvodnění zhotovitele:</u> Vzhledem k zásahům do povrchů bylo doporučeno zhotovitelem provést sjednocení pohledů omítek povrchovou úpravou - štukem. Dle zadání měly být omítky opraveny v rozsahu max. do 30%. <u>Vyjádření AD/projektanta:</u> Vzhledem k degradaci omítek v čase a navýšení objemu oprav je požadavek oprávněný. <u>Vyjádření TDS:</u> Při posouzení připravené vzorové místnosti se ukázalo, že provedení vyhovujícího povrchu stěn a stropů rekonstruovaných místností je bez provedení vápenného štuky a sjednocení povrchu původního a novými instalacemi narušeného nereálné. ZL hraje významnou roli a výrazný dopad na rozpočet. Přesto budeme jeho přijetí za TDS podporovat.		
<b>Ostatní/různé:</b>		
<b>Navrhovatelé:</b>		
<b>Podpis a datum:</b>	<b>Podpis a datum:</b> 22. 06. 2022  	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	
<b>Schvalovatelé:</b>		
<b>Podpisa datum:</b>	<b>Podpis a datum:</b>	
CONTRACTOR/ZHOTOVITEL	CUSTOMER/OBJEDNATEL	

<b>ZMĚNOVÉ HLÁŠENÍ</b>	<b>ZH č. : 15</b>
------------------------	-------------------

Fotodokumentace:







# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/23d

Stavba: Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>852 843,02</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	<b>852 843,02</b>	<b>179 097,03</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 031 940,05</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/23d

Stavba: Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Místo: Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

852 843,02

1 031 940,05

2022/23/6	ZL 6 -Přizdivky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo
2022/23/9/	ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn
4	chodeb
2022/23/9/	ZL 14 - Podchycení konstrukci schodišť při
5	bourání
2022/23/9/	ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek
6	stropů a stěn
2022/23/9/	ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou
7	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/6 - ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

**2022/23/6 - ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo**

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/6 - ZL 6 -Přizdívky v koupelny 3.NP až 5.NP SV křídlo

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	346272226NEW	Přizdívka z pórabetonových tvárníc tl 75 mm	m2	29,400		
	VV		m.č. 5.59,5.55,5.51				
	VV		9,8		9,800		
	VV		m.č.4.59, 4.55, 4.51				
	VV		9,8		9,800		
	VV		m.č.3.59, 3.55, 3.51				
	VV		9,8		9,800		
	VV		Součet		29,400		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	29,400		
	VV		m.č. 5.59,5.55,5.51				
	VV		9,8		9,800		
	VV		m.č.4.59, 4.55, 4.51				
	VV		9,8		9,800		
	VV		m.č.3.59, 3.55, 3.51				
	VV		9,8		9,800		
	VV		Součet		29,400		
D		998	Přesun hmot				
3	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m	t	1,665		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	030001000NEW	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

**2022/23/9/4 - ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn chodeb**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně




Sazba daně

21,00%

15,00%

**Cena s DPH**

**v CZK**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

**2022/23/9/4 - ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn chodeb**

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/4 - ZL 13 - Odstranění emailových nátěrů ze stěn chodeb

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783806805NEW	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	617,750		
	VV		3.NP - m.č. 3.19,3.20,3.48				
	VV		172,1*1,25			215,125	
	VV		4.NP - m.č. 4.19, 4.20, 4.48				
	VV		168,6*1,25			210,750	
	VV		5.NP - m.č. 5.19,5.20,5.48				
	VV		153,5*1,25			191,875	
	VV		Součet			617,750	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-617,750		
	VV		3.NP - m.č. 3.19,3.20,3.48				
	VV		172,1*1,25*1			-215,125	
	VV		4.NP - m.č. 4.19, 4.20, 4.48				
	VV		168,6*1,25*1			-210,750	
	VV		5.NP - m.č. 5.19,5.20,5.48				
	VV		153,5*1,25*1			-191,875	
	VV		Součet			-617,750	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	030001000NEW	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/5 - ZL 14 - Podchycení konstrukcí schodišť při bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně



Sazba daně

21,00%

15,00%



**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

**2022/23/9/5 - ZL 14 - Podchycení konstrukcí schodišť při bourání**

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/5 - ZL 14 - Podchycení konstrukcí schodišť při bourání

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	975063161NEW	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1200 kg/m2	m2	42,000		
	VV		2.NP až 5.NP				
	VV		4*4*1,5		24,000		
	VV		4*1*1,5		6,000		
	VV		4*2*1,5		12,000		
	VV		Součet		42,000		
D		998	Přesun hmot				
2	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m	t	0,952		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	030001000NEW	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/6 - ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek stropů a stěn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

  
0,00

Sazba daně

21,00%  
15,00%

Cena s DPH

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

**2022/23/9/6 - ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek stropů a stěn**

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/6 - ZL 15 změna rozsahu oprav vnitřních omítek stropů a stěn

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	1 573,700		
	VV		6.NP				
	VV		36,14		36,140		
	VV		5.NP				
	VV		254,18		254,180		
	VV		4.NP				
	VV		297,14		297,140		
	VV		3.NP				
	VV		288,38		288,380		
	VV		2.NP				
	VV		269,18		269,180		
	VV		1.NP				
	VV		428,68		428,680		
	VV		Součet		1 573,700		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 573,700		
	VV		6.NP				
	VV		36,14		36,140		
	VV		5.NP				
	VV		254,18		254,180		
	VV		4.NP				
	VV		297,14		297,140		
	VV		3.NP				
	VV		288,38		288,380		
	VV		2.NP				
	VV		269,18		269,180		
	VV		1.NP				
	VV		428,68		428,680		
	VV		Součet		1 573,700		
3	K	611325412NEW	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 573,700		
	VV		6.NP				
	VV		36,14		36,140		
	VV		5.NP				
	VV		254,18		254,180		
	VV		4.NP				
	VV		297,14		297,140		
	VV		3.NP				
	VV		288,38		288,380		
	VV		2.NP				
	VV		269,18		269,180		
	VV		1.NP				
	VV		428,68		428,680		
	VV		Součet		1 573,700		
4	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-1 573,700		
	VV		6.NP				
	VV		36,14		36,140		
	VV		5.NP				
	VV		254,18		254,180		
	VV		4.NP				
	VV		297,14		297,140		
	VV		3.NP				
	VV		288,38		288,380		
	VV		2.NP				
	VV		269,18		269,180		
	VV		1.NP				
	VV		428,68		428,680		
	VV		Součet		1 573,700		
	VV		1573,7*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-1 573,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	612131121NEW	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4 127,900		
	VV		6.NP				
	VV		128,54		128,540		
	VV		5.NP				
	VV		442,35+306,04		748,390		
	VV		4.NP				
	VV		748,39		748,390		
	VV		3.NP				
	VV		467,49		467,490		
	VV		2.NP				
	VV		1196,72		1 196,720		
	VV		1.NP				
	VV		1162,24-323,87		838,370		
	VV		Součet		4 127,900		
6	K	612311131NEW	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4 127,900		
	VV		6.NP				
	VV		128,54		128,540		
	VV		5.NP				
	VV		442,35+306,04		748,390		
	VV		4.NP				
	VV		748,39		748,390		
	VV		3.NP				
	VV		467,49		467,490		
	VV		2.NP				
	VV		1196,72		1 196,720		
	VV		1.NP				
	VV		1162,24-323,87		838,370		
	VV		Součet		4 127,900		
7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	4 127,900		
	VV		6.NP				
	VV		128,54		128,540		
	VV		5.NP				
	VV		442,35+306,04		748,390		
	VV		4.NP				
	VV		748,39		748,390		
	VV		3.NP				
	VV		467,49		467,490		
	VV		2.NP				
	VV		1196,72		1 196,720		
	VV		1.NP				
	VV		1162,24-323,87		838,370		
	VV		Součet		4 127,900		
8	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	-4 127,900		
	VV		6.NP				
	VV		128,54		128,540		
	VV		5.NP				
	VV		442,35+306,04		748,390		
	VV		4.NP				
	VV		748,39		748,390		
	VV		3.NP				
	VV		467,49		467,490		
	VV		2.NP				
	VV		1196,72		1 196,720		
	VV		1.NP				
	VV		1162,24-323,87		838,370		
	VV		Součet		4 127,900		
	VV		4127,9*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-4 127,900		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m	t	18,352		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
10	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/7 - ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně



Sazba daně

21,00%

15,00%



**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/7 - ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion - ubytovna - Změnové listy 23.5. - Město Lovosice - 1.část

Objekt:

2022/23/9/7 - ZL 16 - Řezání schodiště lanovou pilou

Místo:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	977211112NEW	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	16,460		
	VV		schodnice ze 4.NP do 5.NP				
	VV		2*2*3,68			14,720	
	VV		1*1,74			1,740	
	VV		Součet			16,460	
	D	998	Přesun hmot				
2	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 12 do 24 m	t	0,003		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
3	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SOD	%	0,483		
