


MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Rondoš
E-mail /tel.: [REDACTED]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel/dodavatel: Chládek & Tintěra a.s.
Sídlo: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Ing. Stanislav Fousek, Vladimír Jehlička, Libuše Tintěrová, členové představenstva.
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.
Zástupce pro věcná jednání: Vladimír Jehlička, Martin Suchan, mosty a inženýrské konstrukce
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 62743881
DIČ: CZ62743881
Bank. spojení: KB, a.s., Litoměřice, č. ú.: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 706, datum zápisu 14.06.1995

*(dále jen **zhotovitel**)*

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeli dne 12.06.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“.
2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek I. Účel a předmět plnění

Do čl. I se doplňuje bod 11. takto:

11. V návaznosti na čl. I. bod 3. zhotovitel upraví rozsah prací souvisejících s akcí „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ podle Změnového listu.

Článek IV. Doba plnění

V čl. IV. Doba plnění se nahrazuje původní znění bodu 1. novým zněním:

1. Termín ukončení realizace zakázky je do 21.12.2017 a následné zahájení zkušebního provozu .

Článek V. Cena

V čl. V. Cena se nahrazuje původní znění bodu 1. novým zněním:

1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 27.4.2017, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“) a Změnový list – změna během výstavby č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Tyto položkové rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy a dodatku č. 1

Původní cena díla	18.372.085,- Kč bez DPH
Méněpráce	- 3.284,- Kč bez DPH
Vícepráce	100.500,- Kč bez DPH
Nová cena díla	18.469.301,- Kč bez DPH

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtech, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy:

- Změnový list - změna během výstavby č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 22/11/2017, č. usn. 456/2017

V Lovosicích, dne 23/11/2017
Za Objednatele :



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

V Litoměřicích, dne 23/11/2017
za Zhotovitele :



Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva



Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST – ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

Identifikace stavby: „Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích“		Číslo změny: 1	
		Datum zpracování: 16.11.2017	
Určeno pro:	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
objednatele <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě doložených soupisů prací jednotlivých změn bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací a méněprací.			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů - podrobnosti viz příloha Návrh na ocenění změny</u> + 100 500 Kč			
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů - viz příloha Návrh na ocenění změny</u> - 3 284 Kč			
Rozdíl - hodnota přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů + 100 500Kč - 3 284 Kč + 97 216 Kč			
Počet připojených listů: 7		Počet připojených výkresů: 1	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 18 372 085 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: bez dopadu na původní smluvní lhůtu	
zvýšení ceny o	97 216 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	7 kalendářních dní
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	18 469 301 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	6 M + 7 dní 21.12.2017 (zahájení zkušebního provozu)
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Ron [redacted]		Podpis zhotovitele, datum, razítko: Vladimír Jehlička [redacted]	
Podpis TDI, datum, razítko: Ing. Jiří Šašek [redacted]		Podpis AD, datum, razítko: Ing. Tomáš Trachta [redacted]	

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky:

Lovosice - Revitalizace autobusového nádraží

Klasifikace:

Fáze zakázky:

Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Chládek a Tintěra a.s.

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu:

VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	97 216	20 415	117 632

Celkem bez DPH: 97 216 CZK

Celkem s DPH: 117 632 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Eva Müllerová	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	97 216	20 415	117 632
Měněpráce: Měněpráce - zádlažba ostrůvků	- 3 284	- 690	- 3 973
Vícepráce: Vícepráce - úprava nástupních ostrůvků	100 500	21 105	121 605
	97 216	20 415	117 632

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba							97 216
Méněpráce: Méněpráce - zádlažba ostrůvků							- 3 284
5: Komunikace							- 3 284
1	B	582614b	Kryty z beton.dlaždic se zámkem barev. tl. 60 mm do lože z kam. - hnědá	m2	- 8,000		
2	B	58261A	Kryty z beton.dlaždic se zámkem barev. reliéf.tl. 60 mm do lože z kam. - červená	m2	- 1,600		
Vícepráce: Vícepráce - úprava nástupních ostrůvků							100 500
1: Úprava týlu nástupiště č 2-5							72 756
3	SP	985141111	Vyčištění - odstranění živичné závlky	m	30,240		
4	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních+bezbariérových - ručně	m	30,240		
5	SP	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	30,240		
6	SP	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl do 300 mm	m2	2,604		
7	SP	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl do 300 mm	m2	10,400		
8	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,000		
9	SP	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,000		
10	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	98,000		
11	ON	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,000		
12	SP	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	2,736		
13	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,736		
14	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,736		
15	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,695		
16	ON	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,651		
17	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	30,240		
18	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,240		
19	SP	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	8,000		
20	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,122		
21	SP	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	10,400		
22	SP	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	10,400		
23	SP	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	10,400		
24	H	583 25	Dodávka kamenné dlažby	t	2,200		

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25	SP	599632111	Vyplnění spár kamenné dlažby MC se zatřením	m2	10,400		
26	SP	919121132	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,240		
27	SP	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	kus	12,000		
28	SP	783325124	Nátěry syntetické trub barva dražší matný povrch 2x antikorozní a 2x email	m2	1,000		
29	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	19,924		
2: Přemístění stožáru VO							16 467
30	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,250		880
31	SP	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,500		
32	SP	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,500		
33	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	7,000		
34	ON	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500		
35	SUB	743913	Demontáž svítidel výbojkových	kus	1,000		
36	SUB	741917	Demontáž sloupů vzdušného vedení ocel. trubkových	kus	1,000		
37	SP	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,800		
38	SP	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,250		
39	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,050		
40	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,050		
41	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,250		
42	ON	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,785		
43	SP	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,250		
44	SP	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	1,000		
45	SUB	742124 15	Kabelová spojka vč. kabelu	Kč	1,000		
46	SUB	741157 13	Montáž sloupu VO	Kč	1,000		
47	SUB	87615	Uložení kabelu do chráničky z trub plastových DN 50 mm	m	2,000		
48	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,200		
49	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů štěrkodrtí se zhuštěním	m3	0,600		
3: Odvodnění vstupu do bytového domu							
50	SP	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,650		
51	SP	935931322	Odvodnění plastovými žlaby pro zatížení C250 s roštem litinovým vnitřní š x hl 150x74 mm	m	2,600		
52	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,260		
53	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,200		

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
54	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,200		
55	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	0,200		
56	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1,000		
57	ON	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,200		
58	SP	212531111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	0,200		
							97 216

Ing. Tomáš Trachta
projektant
Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí
tel.: +420 475 531 077 / 534 112, linka 15
e-mail: tomas.trachta@valbek.cz

V Ústí n. L., 15.11.2017
Vaše značka: -
Naše značka: 16-UL11-024 / AD1

Město Lovosice
odbor majetku a investic
Vážený pan
Jan Rössler
Školní 407/2
410 30 Lovosice

**Věc: Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích
Vyjádření AD č. 1**

V rámci výkonu autorského dozoru na výše uvedené stavbě jsem byl investorem, na základě podnětu řidičů linkové autobusové dopravy vyzván k vyjádření ohledně zajištění bezpečného průjezdu autobusů.

Připomínky řidičů linkové autobusové dopravy byly následně upřesněny v rámci KD č. 10, kde jejich zástupce p. Kühnel přednesl obavu z možné kolize zadní části vozidel s dopravně-bezpečnostním zábradlím podél přístupu pro pěší, při zajíždění do zastávek (v rámci vybočení převisu nad zadní nápravou). Dispoziční uspořádání autobusového nádraží bylo v rámci projekčních prací prověřeno vlečnými křivkami dle TP 171 a takováto kolize z nich není patrná, nicméně byl v rámci KD na 7.11.2017 domluven kontrolní průjezd linkového autobusu.

1 / 2

Kontrolní průjezd dne 7.11.2017 prokázal, že navržené dispoziční uspořádání autobusového nádraží vyhovuje pro bezpečný průjezd autobusů, bez kolize s dopravně-bezpečnostním zábradlím (v době zkoušky simulováno mobilním oplocením), či jiným příslušenstvím. V rámci zkoušení průjezdu se ovšem ukázalo, že nájezd do zastávky není pro řidiče příliš komfortní a může nastat problém s najetím autobusu přesně podél nástupní hrany. Pro komfortní příjezd do zastávky, souběžně s hranou nástupiště (především u výstupních dveří) byla navržena úprava tylu nástupního ostrůvku jeho zkrácením (pro nástupiště č. 2 – 5). V rámci zápisu do stavebního deníku bylo navrženo úpravu provizorně realizovat na nástupišti č. 5 a vhodnost úpravy opakovaně prověřit 10.11.2017 průjezdem linkového autobusu.

Kontrolní průjezd dne 10.11.2017 prokázal, že pro komfortní příjezd do zastávky je vhodné v tylu nástupního ostrůvku zkrátit nástupní hranu o 2 díly bezbariérového obrubníku a upravit jeho špičku. Vzniklý prostor pak bude do původního tvaru doplněn pojezdnou dlažbou stejně jako u srpovité krajnice. Toto řešení umožní pojezd vzniklé plochy předním kolem a usnadní natočení autobusu k nástupní hraně. Úpravou dojde ke zkrácení nástupní hrany z 15 m na 13 m, přičemž přítomný zástupce odboru dopravy KÚ potvrdil, že tato délka vyhovuje pro nejdelší uvažovaný autobus.

Na základě výše popsaného, v souladu se zápisem do stavebního deníku ze dne 10.11.2017 souhlasím s provedením úpravy v tylu nástupních ostrůvků, dle přílohy vyjádření, u nástupišť č. 2 – 5.



Pracujeme na budoucnosti.
Projektujeme a budujeme infrastrukturu,
kterou proudí civilizace.

Valbek spol. s r.o., středisko Ústí
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení – Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 3395870257/5500
Obchodní rejstřík – Krajský soud Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 4487
tel.: +420 475 531 077 / 534 112, IDDS: bebs53h
e-mail: info.usti@valbek.cz
www.valbek.cz

S pozdravem

Ing. Tomáš Trachta
Valbek, spol. s.r.o.



Valbek, spol. s r.o.
středisko Ústí
Děčínská 717/21
400 03 Ústí n. L.
iČ 48266230
dič CZ48266230

02

Na vědomí: TDI, Ing. Jiří Šásek
Zhotovitel, Martin Chmelař

Přílohy: ÚPRAVA TÝLU NÁSTUPIŠTĚ č. 2 – 5 M 1:50




Pracujeme na budoucnosti.
Projektujeme a budujeme infrastrukturu,
kterou proudí civilizace.

Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí
Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení – Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 3395870257/5500
Obchodní rejstřík – Krajský soud Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 4487
tel.: +420 475 531 077 / 534 112, IDDS: bebs53h
e-mail: info.usti@valbek.cz
www.valbek.cz

ÚPRAVA TÝLU NÁSTUPIŠTĚ Č. 2 - 5

M 1:50

ŘEZ A - A'

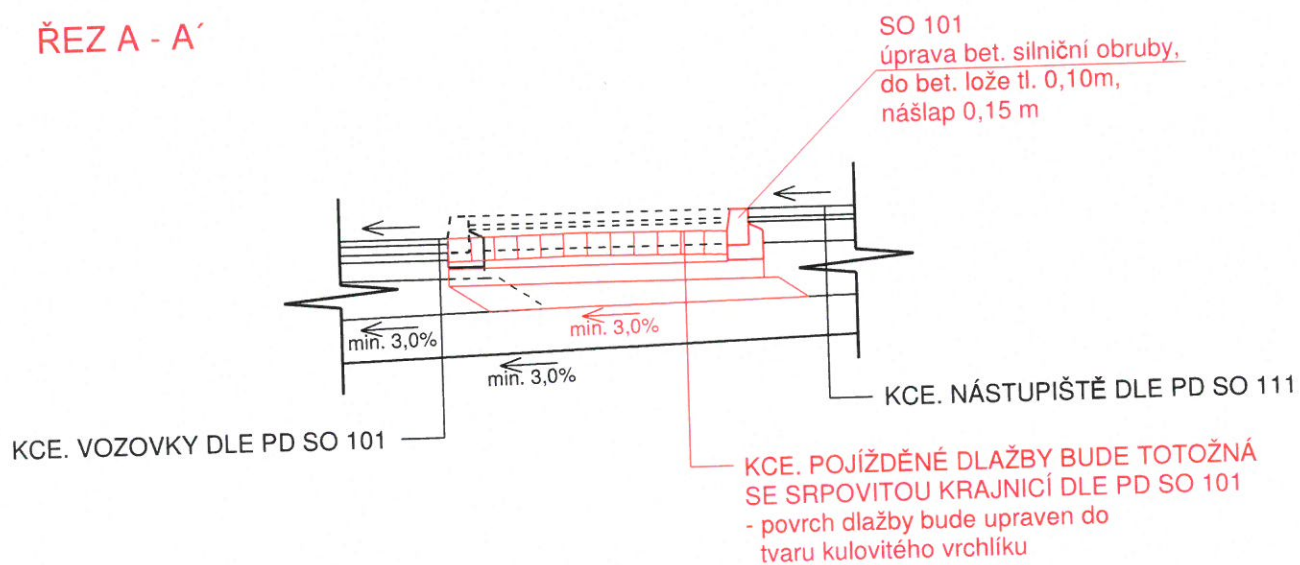

PŮDORYS

